





Processo de Implantação



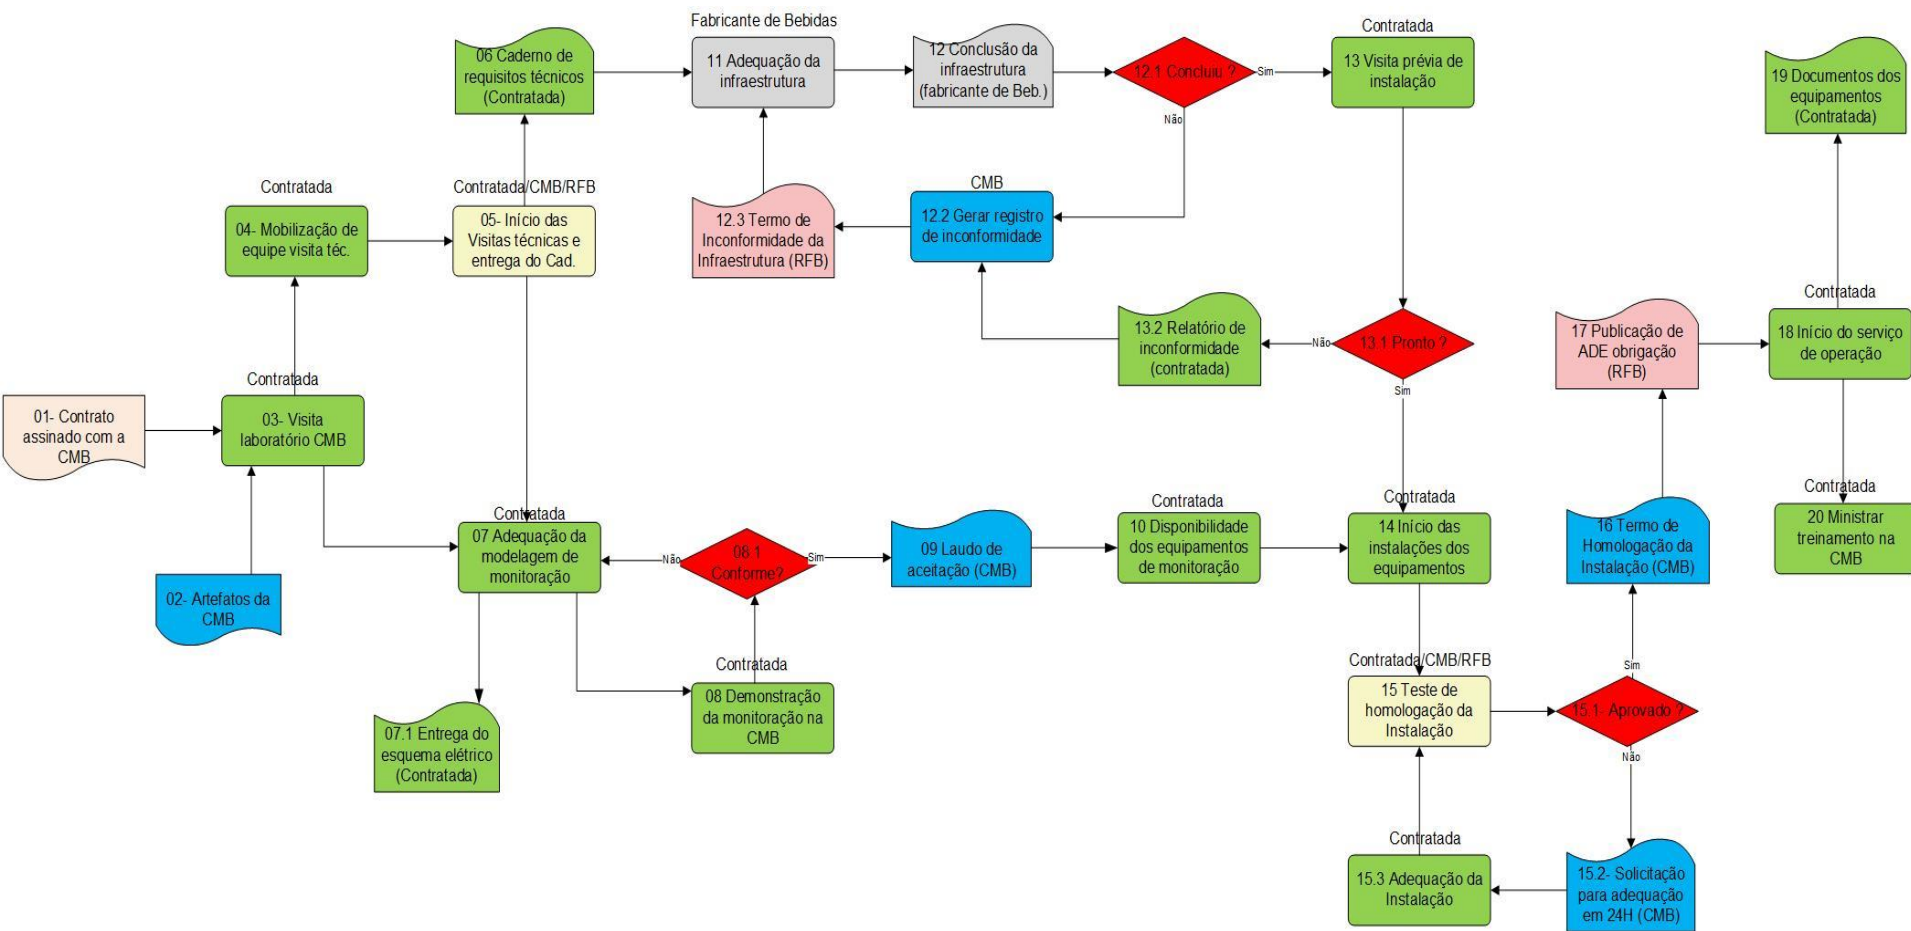


Início do contrato

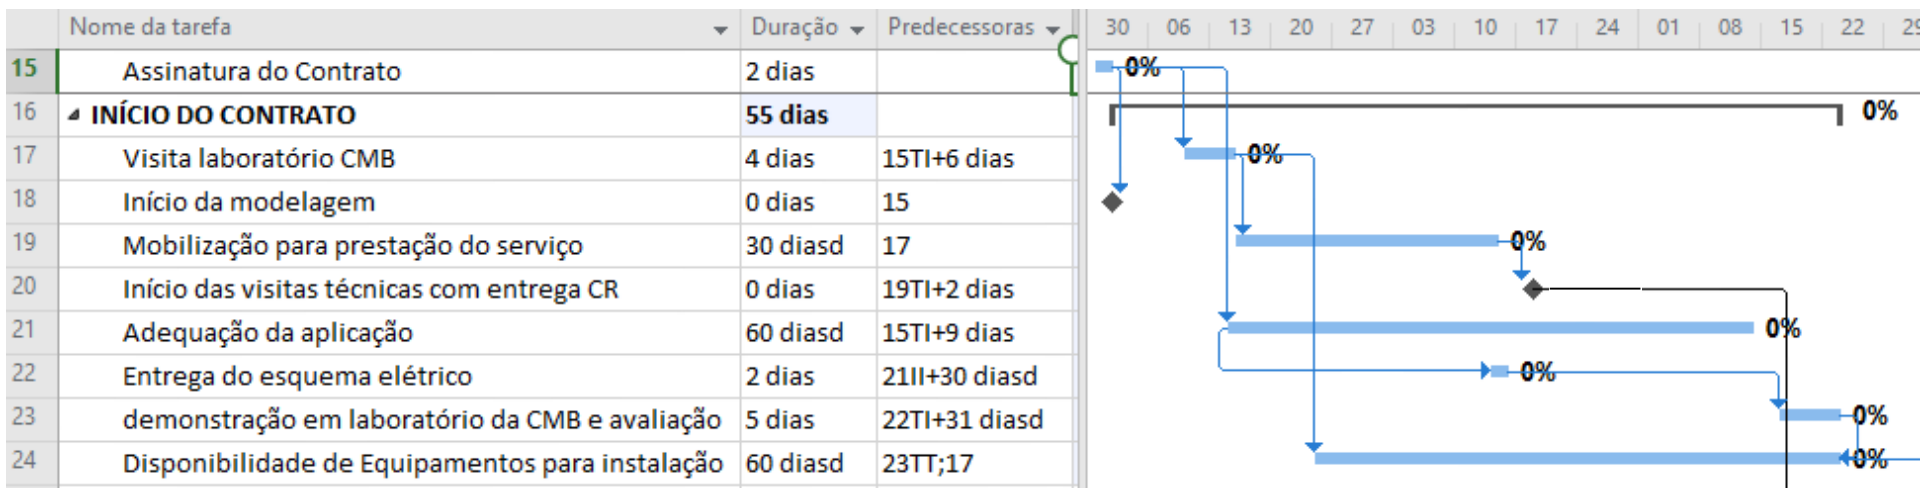




LOTE 01

Contempla os estados
MA, PI, RN, PB, PE, AL,
CE e SE

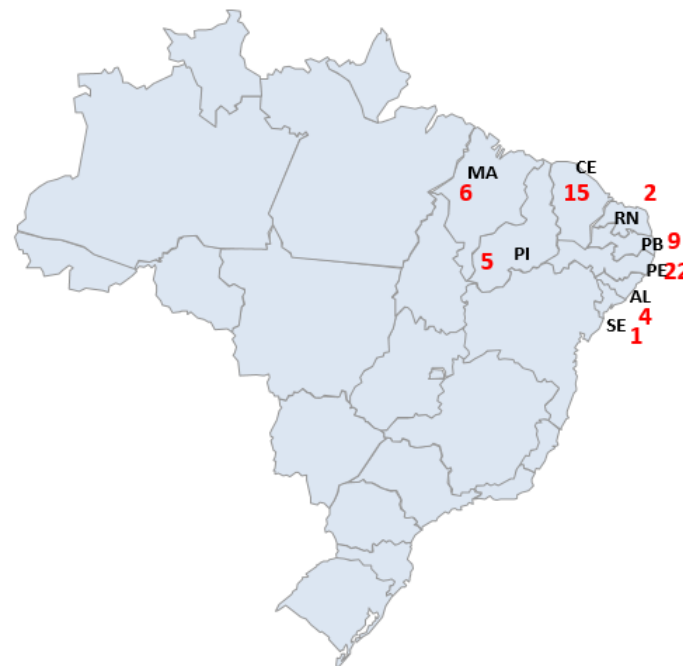


34 fabricantes
223 linhas

| Nome da tarefa | Duração | Predecessoras |
|--|----------|---------------|
| ▲ Lote 1 | 144 dias | |
| Visita Técnica com entrega de caderno de Rec | 18 sems | 20;27 |
| Informação de conclusão de infraestrutura | 18 sems | 30II+1 mêsd |
| Visita prévia de instalação | 18 sems | 31III+1 semd |
| Instalação após adequação de infraestrutura | 18 sems | 24;32II+1 sem |
| Aceite da instalação e Homologação com RFB | 18 sems | 33II+1 sem |
| Início do Serviço de Operação | 1 dia | 34II |
| Entrega dos documentos dos equipamentos | 18 sems | 35 |
| Ministrar treinamento na CMB | 4 sems | 36 |

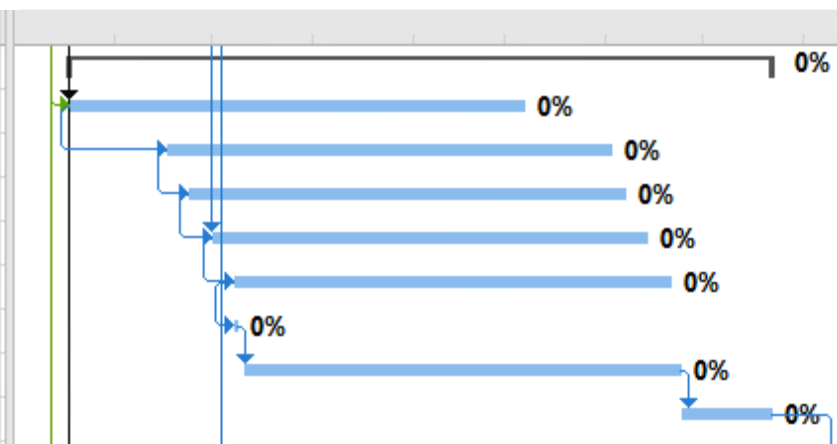




LOTE 02

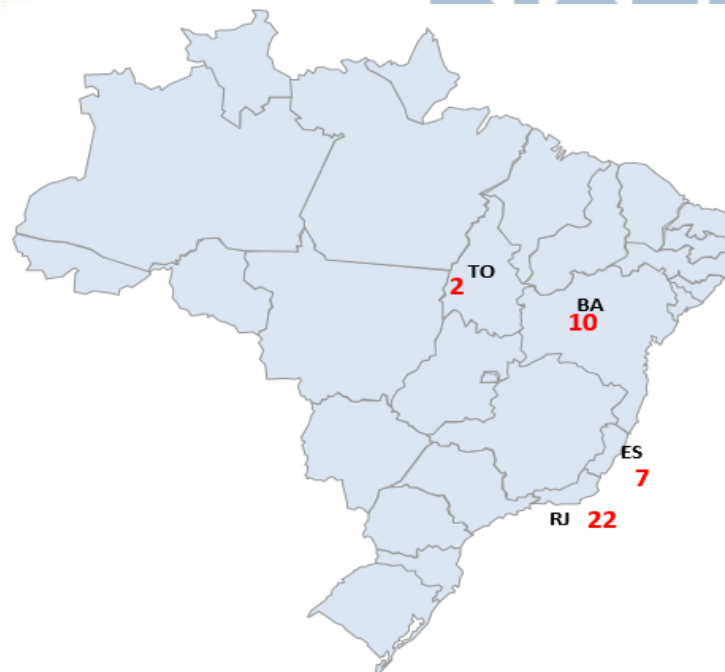

Contempla os estados
TO, BA, ES e RJ

41 fabricantes
213 linhas


| Nome da tarefa | Duração | Predecessoras |
|---|----------|----------------|
| 38 Lote 2 | 120 dias | |
| 39 Visita Técnica com entrega de caderno de Rec | 13 sems | 20;27 |
| 40 Informação de conclusão de infraestrutura | 13 sems | 39II+1 mêsd |
| 41 Visita prévia de instalação | 13 sems | 40II+1 sem |
| 42 Instalação após adequação de infraestrutura | 13 sems | 41III+1 sem;24 |
| 43 Aceite da instalação e Homologação com RFB | 13 sems | 42II+1 sem |
| 44 Início do Serviço de Operação | 1 dia | 43II |
| 45 Entrega dos documentos dos equipamentos | 13 sems | 44 |
| 46 Ministrar treinamento na CMB | 4 sems | 45 |

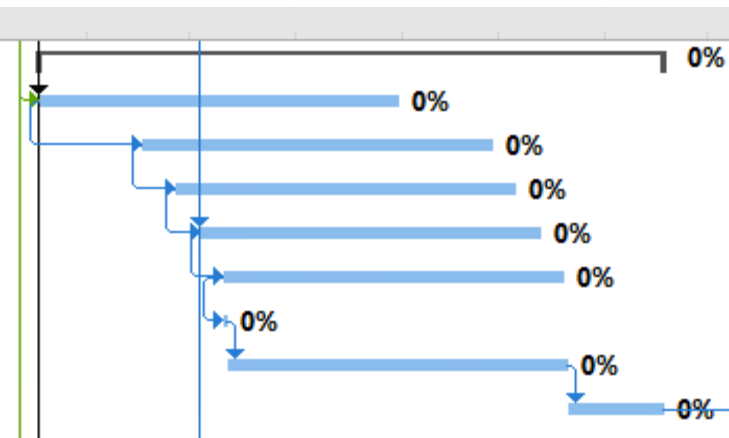




LOTE 03

Contempla os estados
PR, SC e RS

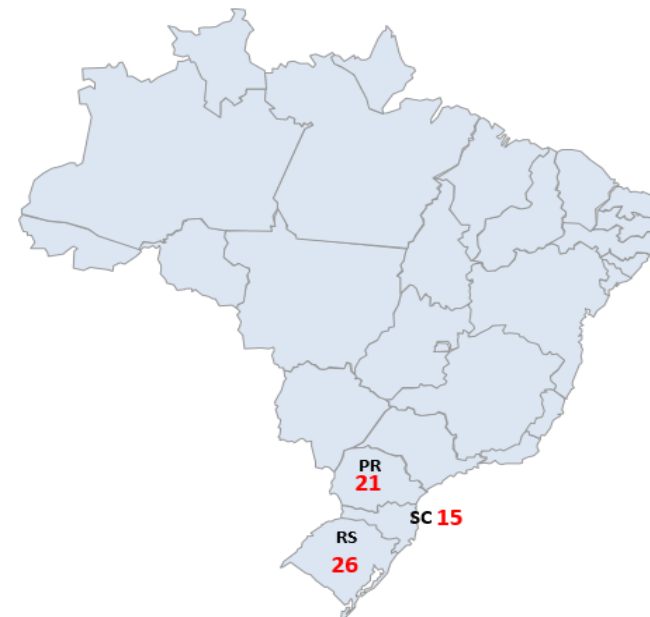

62 fabricantes
228 linhas


| | Nome da tarefa | Duração | Predecessora |
|----|--|----------|---------------|
| 47 | ▲ Lote 3 | 145 dias | |
| 48 | Visita Técnica com entrega de caderno de Rec | 18 sems | 20;27 |
| 49 | Informação de conclusão de infraestrutura | 18 sems | 48II+1 mêsd |
| 50 | Visita prévia de instalação | 18 sems | 49II+1 sem |
| 51 | Instalação após adequação de infraestrutura | 18 sems | 50II+1 sem;24 |
| 52 | Aceite da instalação e Homologação com RFB | 18 sems | 51II+1 sem |
| 53 | Início do Serviço de Operação | 1 dia | 52II |
| 54 | Entrega dos documentos dos equipamentos | 18 sems | 53 |
| 55 | Ministrar treinamento na CMB | 4 sems | 54 |

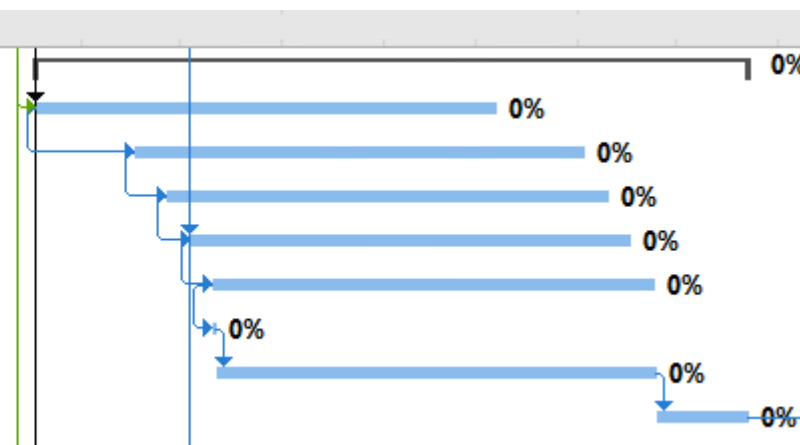




LOTE 04

Contempla os estados
AP, PA, MT, DF, GO, MS
e MG

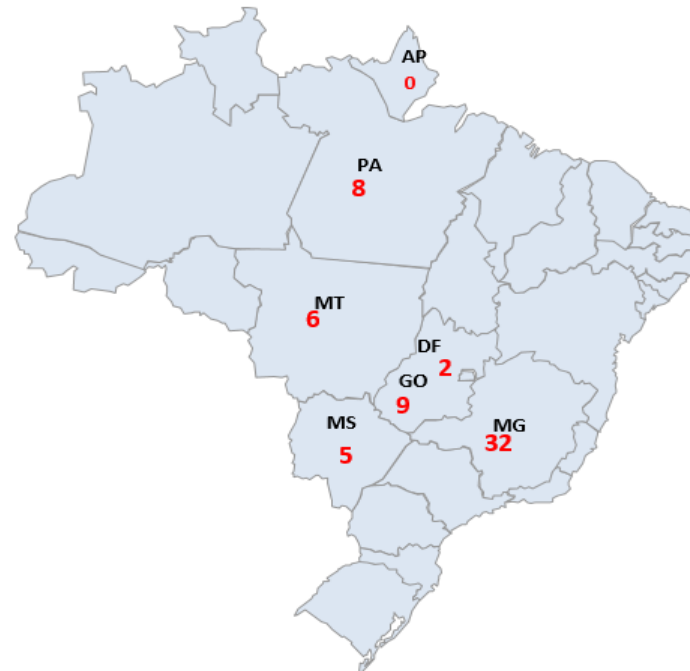

62 fabricantes
219 linhas

| | Nome da tarefa | Duração | Predecessora |
|----|--|----------|---------------|
| 56 | ▲ Lote 4 | 135 dias | |
| 57 | Visita Técnica com entrega de caderno de Rec | 16 sems | 20;27 |
| 58 | Informação de conclusão de infraestrutura | 16 sems | 57II+1 mêsd |
| 59 | Visita prévia de instalação | 16 sems | 58II+1 sem |
| 60 | Instalação após adequação de infraestrutura | 16 sems | 59II+1 sem;24 |
| 61 | Aceite da instalação e Homologação com RFB | 16 sems | 60II+1 sem |
| 62 | Início do Serviço de Operação | 1 dia | 61II |
| 63 | Entrega dos documentos dos equipamentos | 16 sems | 62 |
| 64 | Ministrar treinamento na CMB | 4 sems | 63 |

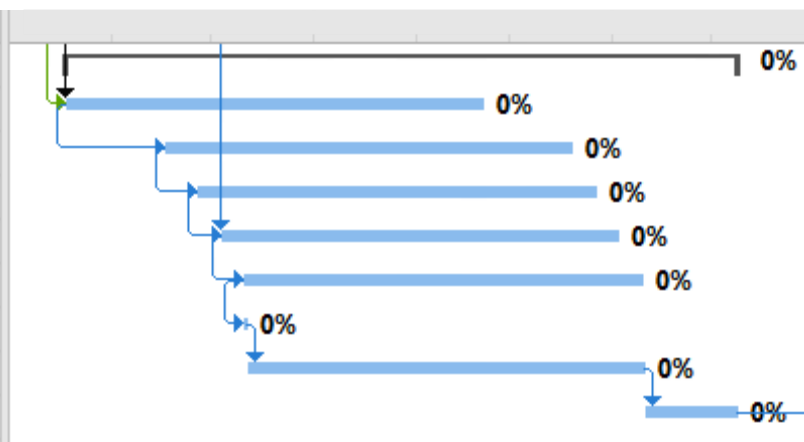





LOTE 05

Contempla os estados
RR, AM, RO, AC e SP

87 fabricantes
382 linhas

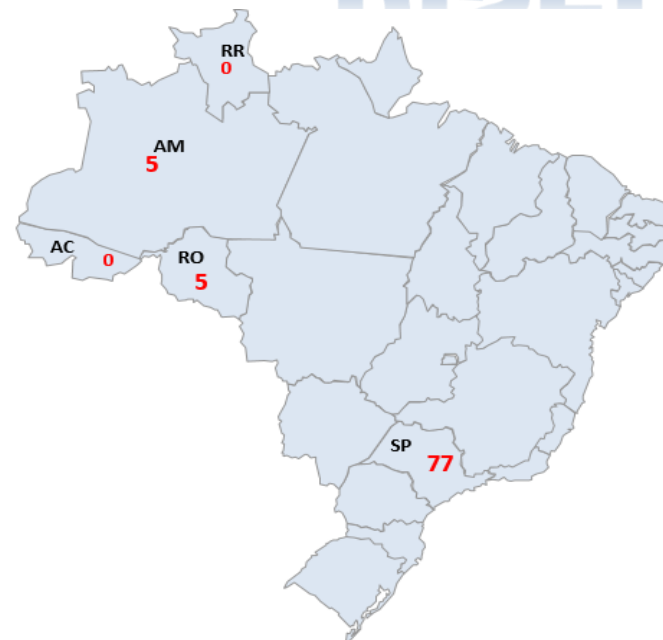

| | Nome da tarefa | Duração | Predecessoras |
|----|--|----------|---------------|
| 65 | ▲ Lote 5 | 160 dias | |
| 66 | Visita Técnica com entrega de caderno de Rec | 21 sems | 20;27 |
| 67 | Informação de conclusão de infraestrutura | 21 sems | 66II+1 mêsd |
| 68 | Visita prévia de instalação | 21 sems | 67II+1 sem |
| 69 | Instalação após adequação de infraestrutura | 21 sems | 68II+1 sem;24 |
| 70 | Aceite da instalação e Homologação com RFB | 21 sems | 69II+1 sem |
| 71 | Início do Serviço de Operação | 1 dia | 70II |
| 72 | Entrega dos documentos dos equipamentos | 21 sems | 71 |
| 73 | Ministrar treinamento na CMB | 4 sems | 72 |

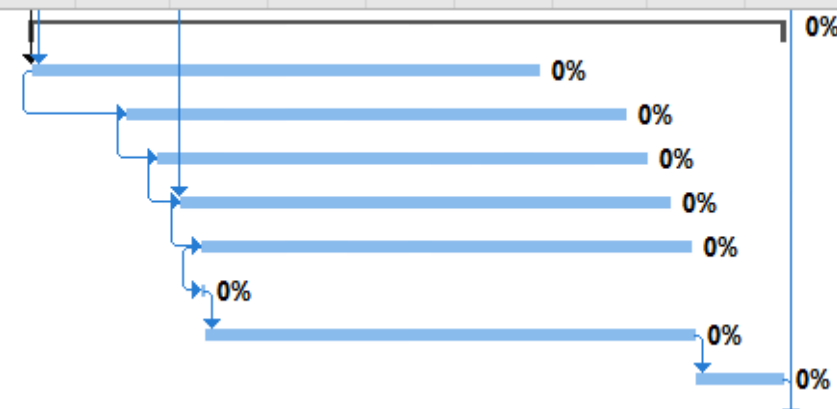



Principais observações

- As atividades foram programadas pela CMB de forma a permitir o maior aproveitamento possível dos deslocamentos a partir do endereço da sua unidade fabril no município do Rio de Janeiro- RJ.
- Os deslocamentos para as atividades, serão realizados de segunda a sexta-feira agrupando as fabricas- conforme cronograma contido no TR.
- A Contratada deverá executar as atividades de visita técnica e homologação, com 2 (duas) equipes atuando em paralelo, com número adequado de pessoas em cada equipe para atender ao cronograma de instalação.
- A eventual não participação pela CMB na atividade não exime a obrigação da Contratante em executar o cronograma conforme previsto, de acordo com a autorização expressa da CMB.
